



Rijkswaterstaat  
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

# Voortgang geluidschermen Standdaarbuiten

Toelichting Rijkswaterstaat

Jeroen van der Heijden  
Mariëlle van Dijk  
Anke Westera

11 september 2023

Pas zelf het vertrouwelijkheidsniveau aan.  
Zie voor uitleg de pagina [Toepassen van vertrouwelijkheidsniveaus](#).



# Agenda

- De geluidschermen
- Stand van zaken
  - Technische uitdagingen
  - Kap en herplant bomen
  - Stikstof
- Vooruitkijken



## De geluidschermen

- Saneringsbesluit mei 2019
- Westelijke scherm
  - Ca 300 meter lang
  - 2 meter hoog
- Oostelijk scherm
  - Ca 600 meter lang
  - 3 meter hoog
- Realisatie eind 2023 wel opgenomen in saneringsbesluit maar niet haalbaar ivm technische uitdagingen





## De geluidschermen - vormgeving

- A17 ligt hoger dan omliggend landschap, grondophogingen nodig
- Betonnen schermen met aan de bewonerszijde begroeiing en transparant deel op het viaduct





## Stand van zaken – technische uitdagingen


- Oude Kerkstraat/Sluissedijk = Regionale waterkering Dintel
- Geen paalfundering toegestaan in regionale waterkering
- Aanwezigheid diverse kruisende kabels en leidingen





## Stand van zaken – kap en herplant bomen

- Bomen moet verwijderd worden ter plekke van de schermen en/of tbv de bouw van de schermen
- Bomenkap zal het beeld vanaf de weg en op de weg veranderen
- Bomen moeten herplant worden
- Zoeken herplantlocatie en opstellen herplantplan

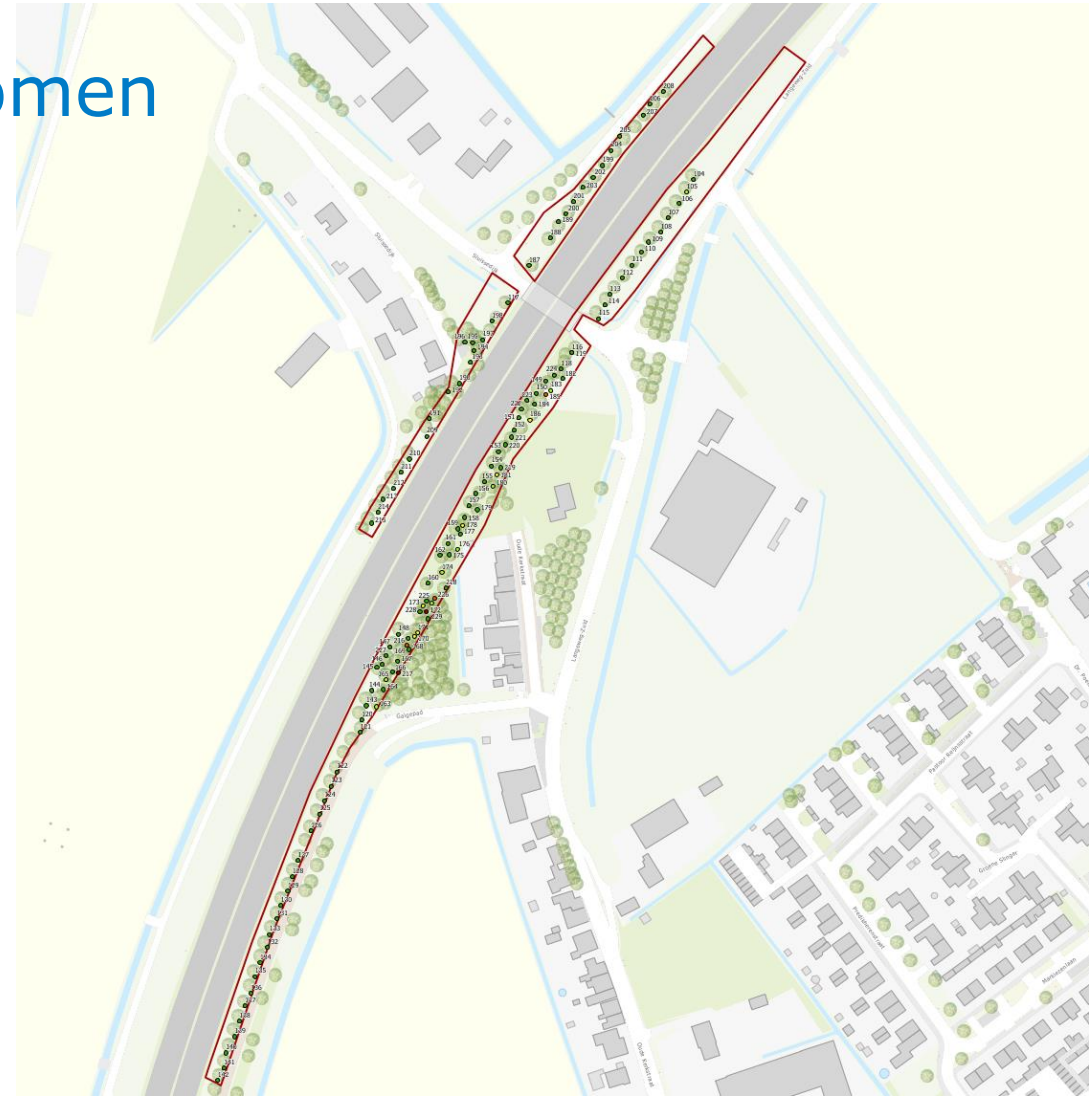



## Stand van zaken - stikstof

- Bouw van geluidschermen veroorzaakt uitstoot stikstof
- Op dit moment zou er niet gestart kunnen worden met de bouw van de schermen
- Wanneer dan wel is onzeker



## Vooruitkijken

- Nog diverse stappen te doorlopen:

Fase	Doorlooptijd
Contractvoorbereiding	6 tot 7 maanden
Aanbesteding*	9 tot 10 maanden
Vorbereiding aannemer	6 tot 7 maanden
Realisatie geluidschermen**	4 tot 5 maanden

\* De aanbesteding kan pas starten op het moment dat er voldoende stikstofruimte is.

\*\* Ivm werken in/nabij een regionale waterkering kan de uitvoering alleen plaatsvinden van april t/m september.





# Heeft u nog vragen?

[jeroen.vander.heijden@rws.nl](mailto:jeroen.vander.heijden@rws.nl)

Landelijke Informatielijn: 0800-8002.
